



INFORME MENSUAL DE OBRA

NO.	PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA INICIO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	POR PAGAR	FUENTE FINANCIAMIENTO	AVANCE CONTRATISTAS
1	COMINGAR Construcciones S. A. DE C. V.	Construcción de una planta tratadora de aguas residuales	2119-1-3-1-2	9912	05/09/2014	97%	100%	\$ 2,130,010.00	\$ 2,127,295.52	\$ 2,039,277.61	\$ 2,039,277.61	\$ 90,732.39	EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS	
2	Constructora VH Construcciones y Asesoría en Ingeniería S.A. de C.V.	Construcción de un Laboratorio Pesado y Adquisición de mobiliario básico y equipamiento especializado (obra nueva)	2119-1-3-1-1	9912	04/02/2015	100%	100%	\$ 19,000,000.00	\$ 19,000,000.00	\$ 18,931,634.39	\$ 18,931,634.39	\$ 21,685.01	RECURSO FEDERAL FAM 2014	
3	Constructora VH Construcciones y Asesoría en Ingeniería S.A. de C.V.	Construcción de la Segunda Etapa de la Planta Tratadora	2119-1-4-1-10	9911	16/02/2017	96%	100%	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,865,857.99	\$ 2,865,857.99	\$ 134,142.01	EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS	

REVISÓ

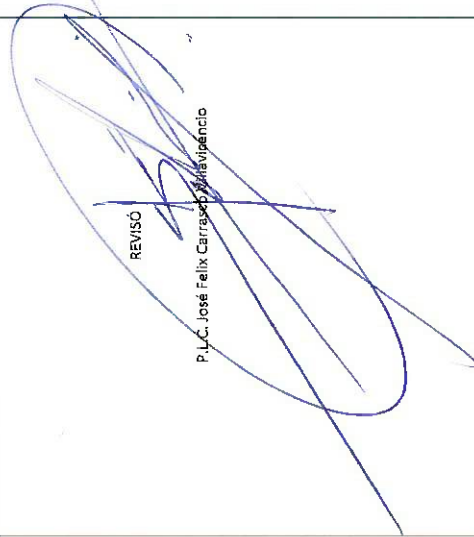

P.L.C. José Félix Carrasco Villavicencio



AUTORIZO

L.C. Alfredo Rodríguez Pérez
